PROJETO EXECUTIVO - APROVAÇÃO PARA PRODUÇÃO

DATA:	NOME RESPONSÁVEL:	ASSINATURA / CARIMBO:

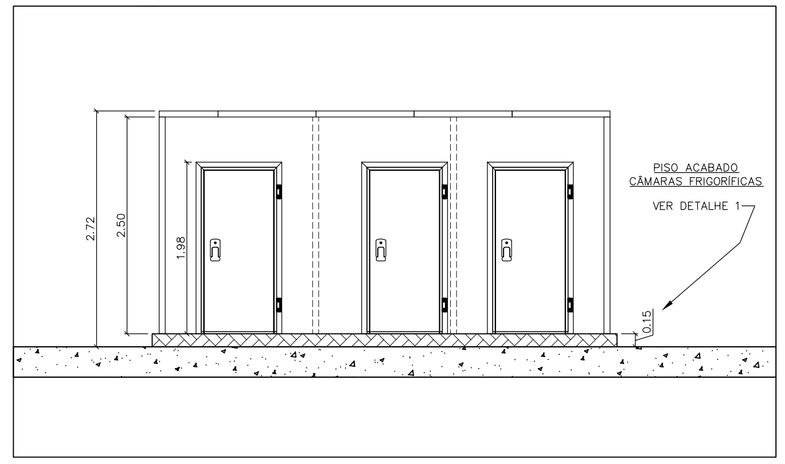

VISTA 1

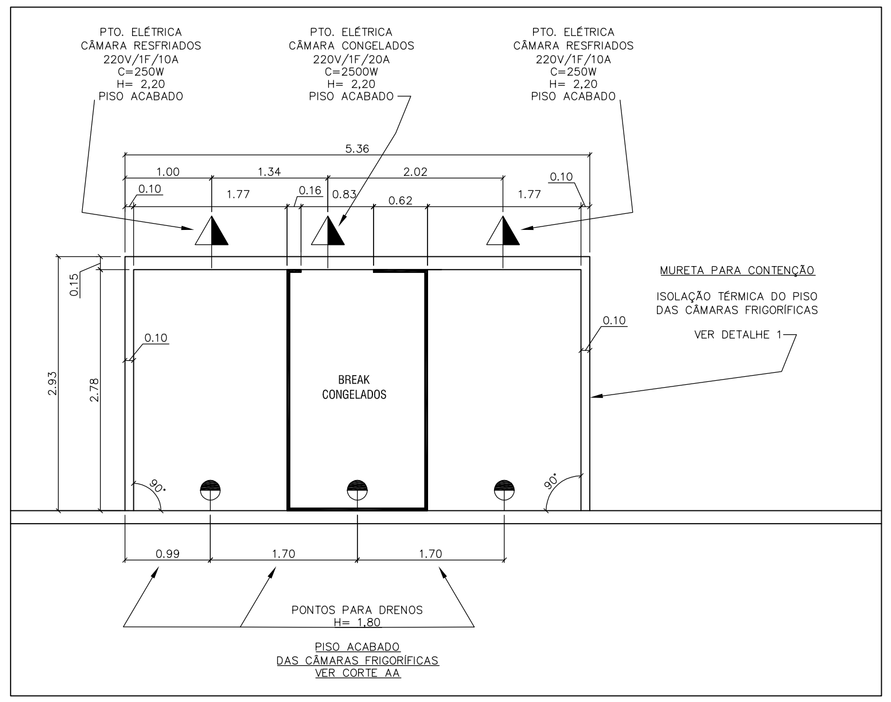

PLANTA DE PONTOS:
ELÉTRICA / DRENO EVAPORADORES / BREAK P/ CONGELADOS

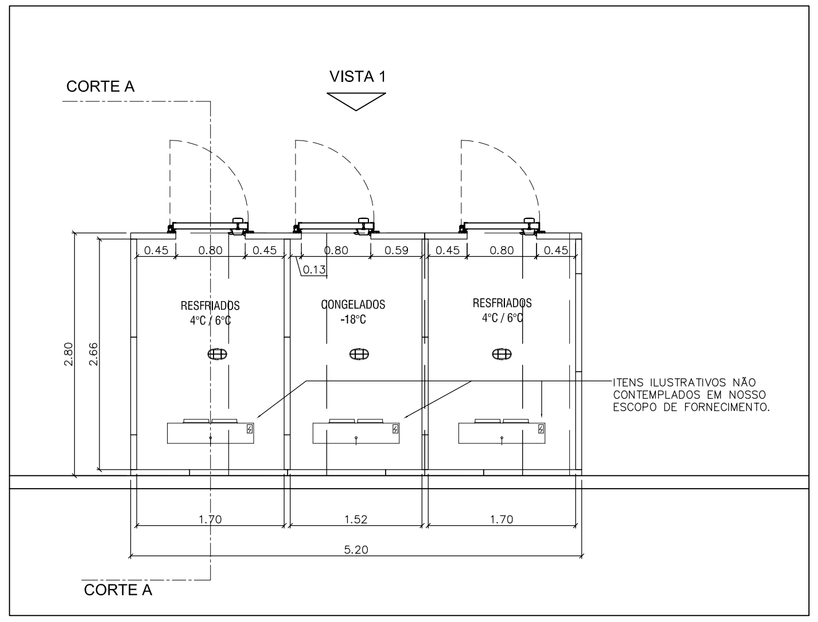

LAY-OUT - CÂMARAS FRIGORÍFICAS

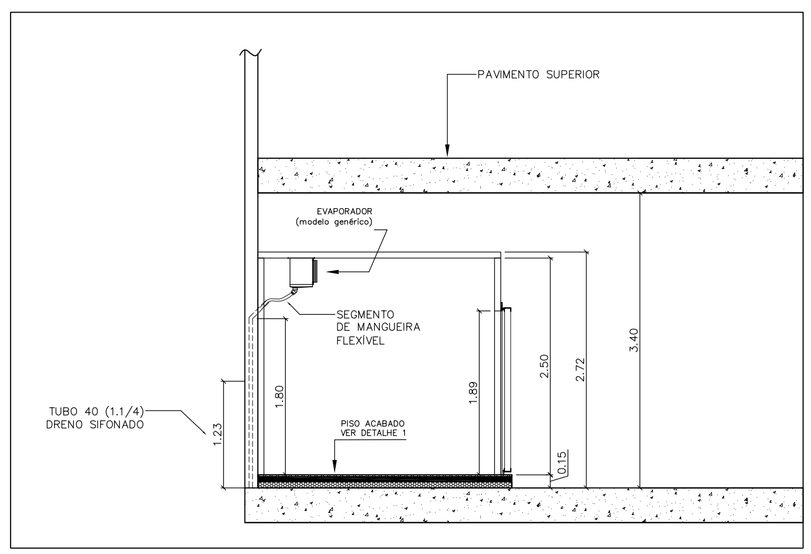

CORTE AA

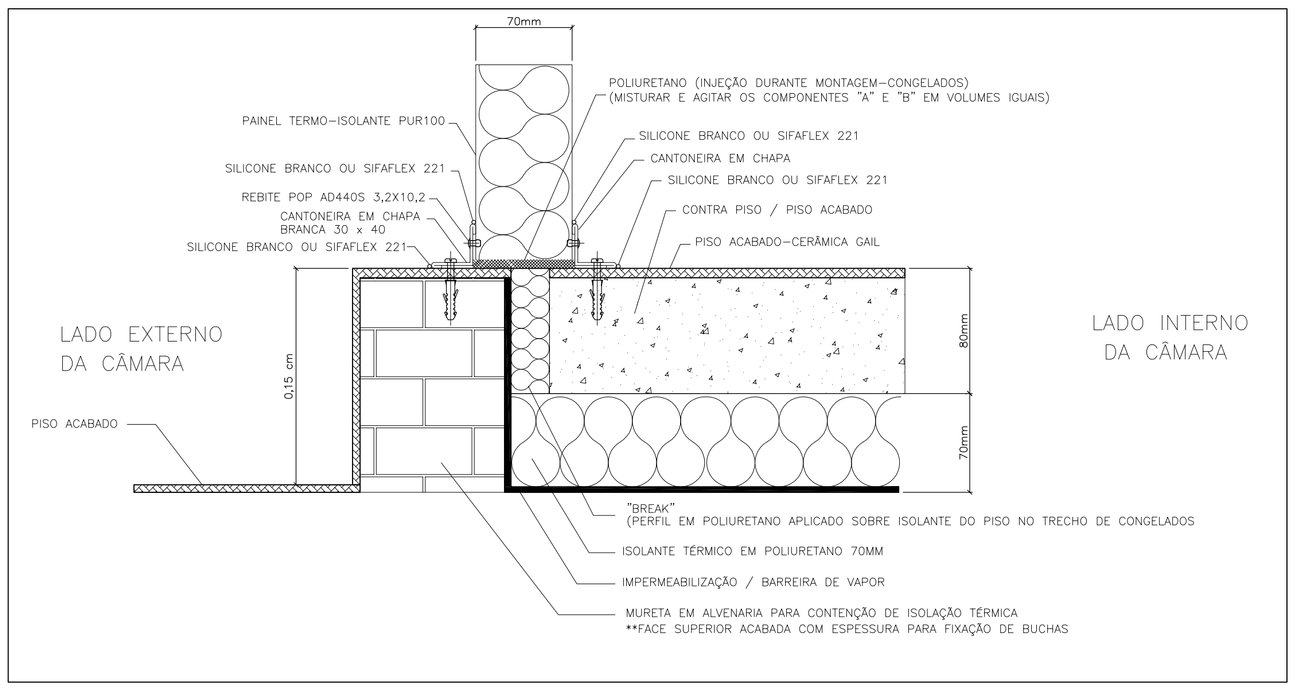

DETALHE-1
FIXAÇAO DO PAINEL AO PISO ALVENARIA
MURETA PARA CONTENÇÃO DA ISOLAÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1- SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUSOS - FORNECIMENTO HR TEDESCO:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS ISOTÉRMICOS FRIGORÍFICOS, PORTAS FRIGORÍFICAS, ILUMINAÇÃO INTERNA, IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLALAÇÃO TÉRMICA DO PISO.

2- FORNECIMENTO PELO COMPRADOR - PADARIA BANDEIRANTES II:

EQUIPAMENTOS E CONTROLES FRIGORÍFICOS DE QUALQUER ESPÉCIE SERÃO FORNECIDOS E INSTALADOS PELO COMPRADOR. PONTOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, PONTO DE DRENO PARA O EVAPORADOR, MATERIAIS E CABOS ELÉTRICOS DE QUALQUER NATUREZA PARA INFRA-ESTRUTURA PREDIAL, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
TRANSPORTE VERTICAL DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE ANDAIMES E OUTROS NÃO ESPECIFICADOS NESTE PROJETO.

LEGENDAS

LUMINÁRIA BLINDADA - 60w - 220v

PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - COMANDO E ILUMINAÇÃO
POTÊNCIA E AMPERAGEM INDICADO EM PROJETO

PONTO DE DRENO PARA EVAPORADORES - Ø 40mm H= INDICADO EM PROJETO

DADOS OPERACIONAIS

ITEM	CÂMARAS FRIGORÍFICAS - PAVIMENTO TÉRREO	DADOS OPERACIONAIS DE TEMPERATURA (°C)			ESTOCAGEM MÁXIMA DIÁRIA(kg/dia)	DIMENSÕES INTERNAS (em metros)			
		ENTRADA	CONSERV.	AMBIENTE		COMP.	LARGURA	ALTURA	VOLUME (m³)
1.1	RESFRIADOS	25	2	35	283	2,66	1,7	2,5	11,31
1.2	RESFRIADOS	25	2	35	283	2,66	1,7	2,5	11,31
1.3	CONGELADOS	-10	-18	35	253	2,66	1,52	2,5	10,11

ESCOPO DE FORNECIMENTO

	CÂMARAS FRIGORÍFICAS - PAVIMENTO TÉRREO	ESPESSURA (mm)	DIMENSÕES DO PAINEL		ESPECIFICAÇÃO	REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO	QTD.	M²
			LARGURA ÚTIL (m)	COMPRIMENTO (m)				
PAINÉIS ISOTÉRMICOS	PAINEL PU 70mm - 2F PP - BRANCO	70	1,10	2,50	PAINEL PAREDE	BRANCO / BRANCO	20	55,00
				2,80	PAINEL TETO	BRANCO / BRANCO	5	15,40
								0,00
								0,00
	PLACA PU 70 - ISOLAMENTO	70	1	2	ISOLAMENTO PISO	CONCRETO / CONCRETO	8	16,00
							TOTAL M²	86,40

UNID. MED	QTD.	ITENS DAS CÂMARAS - CONJUNTO 1
CONJUNTO	3	CONJ. CANTONEIRAS/SELANTES/FIXAÇÃO-PAINÉIS
PEÇA	3	CONJ. ILUMINAÇÃO C/ LUMINÁRIA BLINDADA E ACESS.
PEÇA	3	PORTA FRIG. GIR. 3 BAT - CONGELADOS / RESFRIADOS -1,80 X 0,80 C/ TRAVA

Nº	COMETÁRIOS	AUTOR	DATA	APROVAÇÃO

QUADRO DE REVISÕES / APROVAÇÃO:

CORD. PROJ.: HAMILTON ROMEU TEDESCO

DATA:	REVISÃO:	FOLHA:	ESCALA:	FORMATO:
05/08/2020	0	1/1	1:50	A1

COMPRADOR:
PADARIA BANDEIRANTES II - SR. JOSÉ CARLOS

ENDEREÇO / OBRA:
RUA MARILENA MACHADO, 193 - CID.ADEMAR

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO - CÂMARAS FRIGORÍFICAS

www.hrtedesco.com.br
Rua Barra do Tibaji,934-Bom Retiro
CEP 01128-000 -SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3361-2111 / 3331-6738
WhatsApp (11) 99162-9474

HR Tedesco
