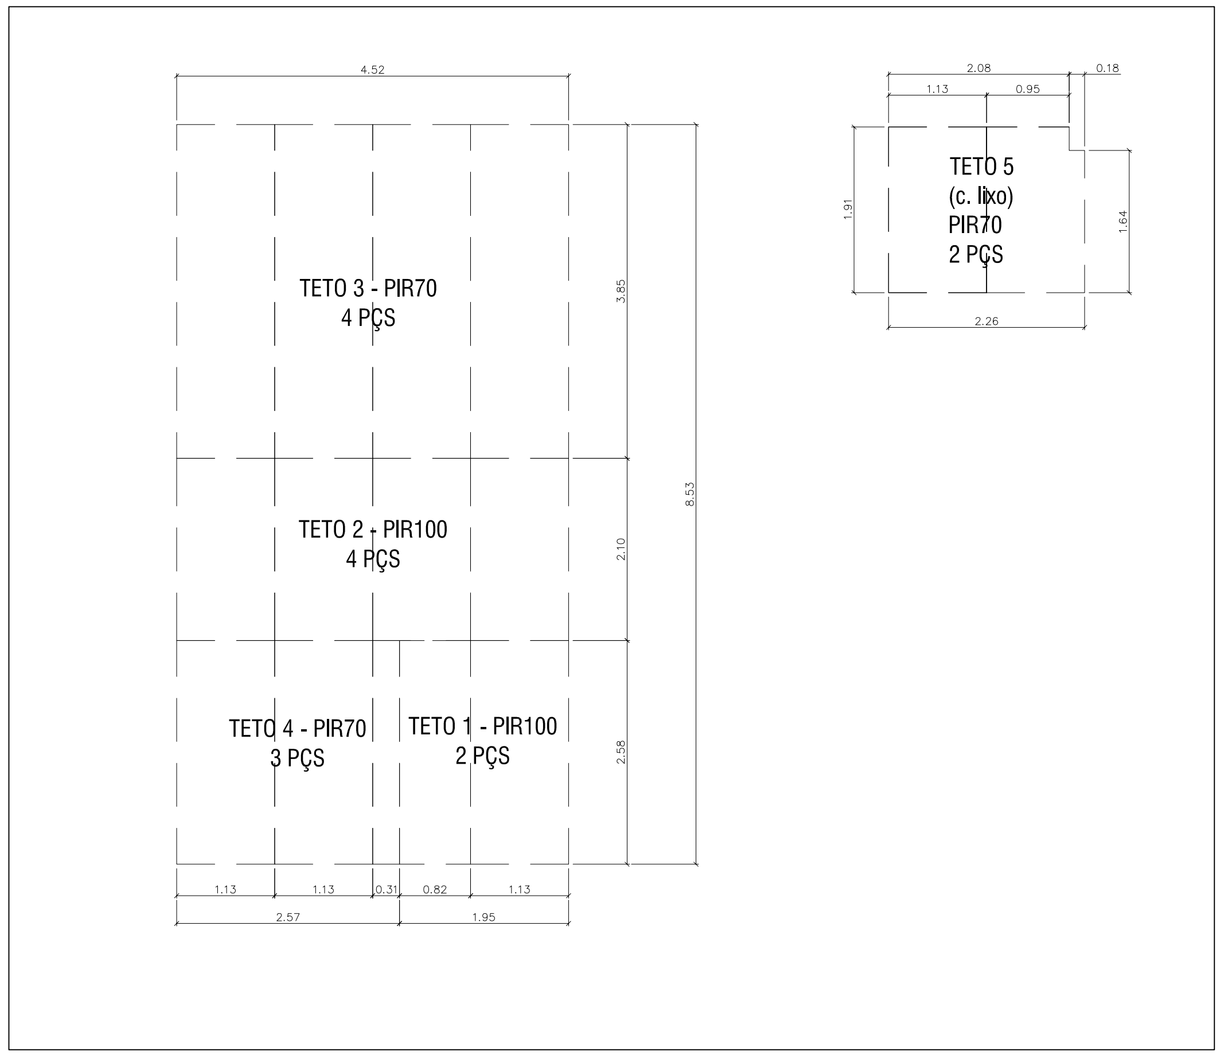

PLANTA DOS TETOS - PAINÉIS ISOTÉRMICOS

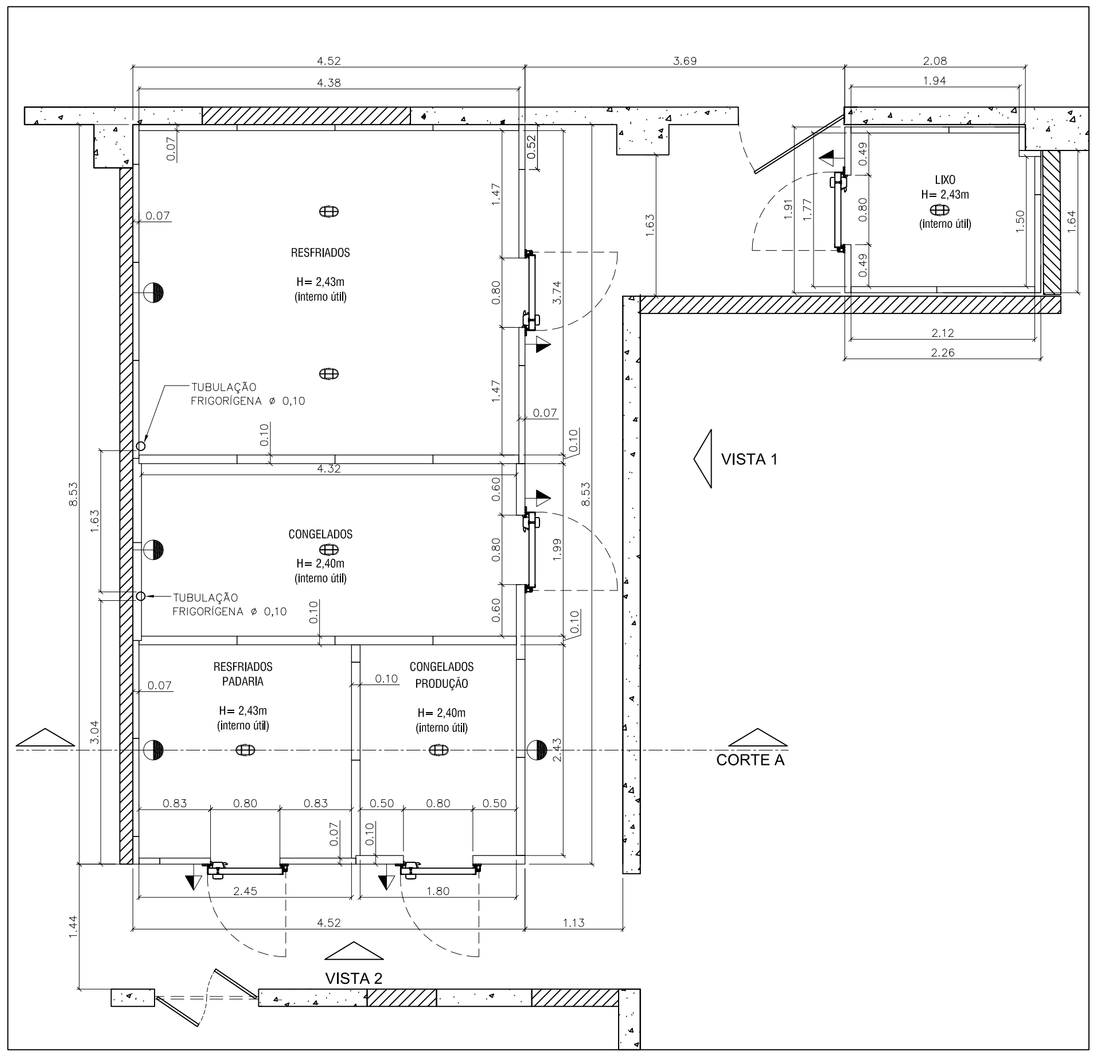

PLANTA LAY-OUT - CÂMARAS FRIGORÍFICAS
PAVIMENTO TÉRREO

LEGENDAS

LUMINÁRIA BLINDADA - 60w - 220v

PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - 220V
H= 2,00 PISO ACABADO

PONTO DE DRENO PARA EVAPORADORES - Ø 40mm H= INDICADO EM PROJETO

ESCOPO DE FORNECIMENTO

ITEM	CÂMARAS FRIGORÍFICAS - PAVIMENTO TÉRREO	DADOS OPERACIONAIS DE TEMPERATURA (°C)			ESTOCAGEM MÁXIMA DIÁRIA(kg/dia)	DIMENSÕES INTERNAS (em metros)			
		ENTRADA	CONSERV.	AMBIENTE		COMP.	LARGURA	ALTURA	VOLUME (m³)
1.1	CONGELADOS	-10	-18	35	270	2,5	1,8	2,4	10,80
1.2	PÃES-MASSAS	15	6	35	366	2,53	2,41	2,4	14,63
1.3	CONGELADOS	-10	-18	35	514	2	4,28	2,4	20,54
1.4	RESFRIADOS	22	2	35	990	3,8	4,34	2,4	39,58
1.5	LIXO ORGÂNICO	22	2	35	206	1,77	1,94	2,4	8,24

	CÂMARAS FRIGORÍFICAS - PAVIMENTO TÉRREO	ESPESSURA (mm)	DIMENSÕES DO PAINEL		ESPECIFICAÇÃO	REVESTIMENTO		QTD.	M²
			LARGURA ÚTIL (m)	COMPRIMENTO (m)		INTERNO	EXTERNO		
PAINÉIS ISOTÉRMICOS PIR INJETADO	PAINEL PU 70mm - 2F PP - BRANCO	70	1,10	2,43	PAINEL PAREDE	BRANCO	BRANCO	24	64,15
				3,92	PAINEL TETO	BRANCO	BRANCO	4	17,25
				2,65	PAINEL TETO	BRANCO	BRANCO	3	8,75
				1,91	PAINEL TETO	BRANCO	BRANCO	2	4,20
				2,08	PAINEL PORTA	BRANCO	BRANCO	5	11,44
	PAINEL PU 100mm - 2F PP - BRANCO	100	1,10	2,43	PAINEL PAREDE	BRANCO	BRANCO	19	50,79
				2,65	PAINEL TETO	BRANCO	BRANCO	2	5,83
				2,10	PAINEL TETO	BRANCO	BRANCO	4	9,24
	PLACA PU 70 - ISOLAMENTO	70	1	2	ISOLAMENTO PISO	CONCRETO	CONCRETO	24	48,00
							TOTAL M²		219,64

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A área do piso da câmara deverá estar nivelada e dimensionado em relação ao peso próprio da câmara mais a carga máxima de estocagem.
Para interligação dos componentes elétricos no interior das câmaras, serão utilizados conduletes e eletrodutos aparentes em PVC na cor cinza.

ITENS INCLUSOS

Toda a mão-de-obra para instalação do(s) painéis frigoríficos, portas e isolação do piso será efetuada por pessoal técnico de nossa responsabilidade.

ITENS NÃO INCLUSOS - INFRAESTRUTURA

Pontos de alimentação elétrica e dreno;
Equipamentos de refrigeração, controles e tubulação;
Serviços e materiais de construção civil;
Viagem e estadia dos montadores fora da Grande São Paulo;
Frete para fora da Grande São Paulo;
Transporte vertical de materiais e locação de andaimes.

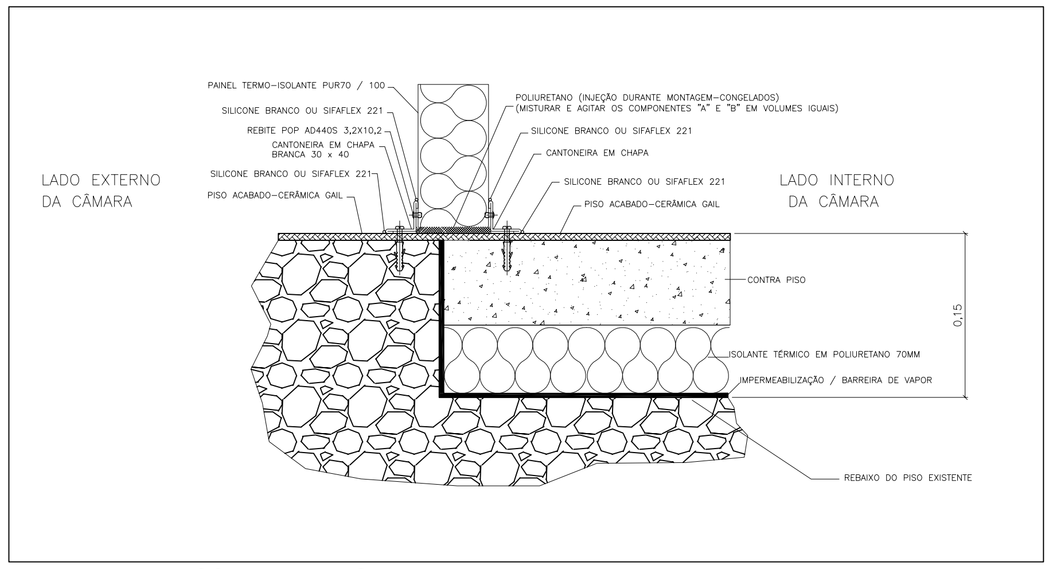

DETALHE 1 - PISO REBAIXADO
FIXAÇAO DO PAINEL ISOLANTE AO PISO ALVENARIA
REBAIXO PARA CONTENÇÃO DA ISOLAÇÃO
S/ ESCALA

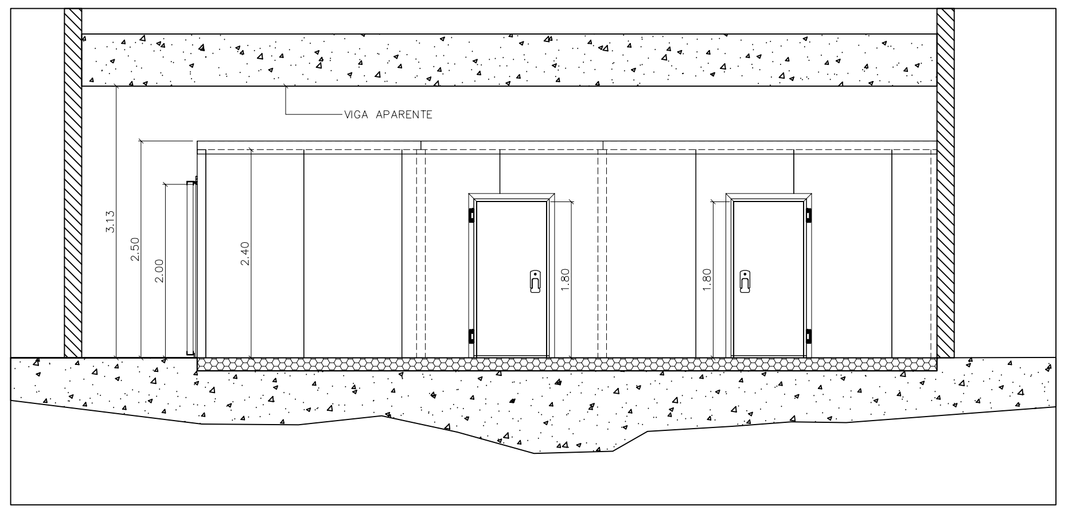

VISTA 1

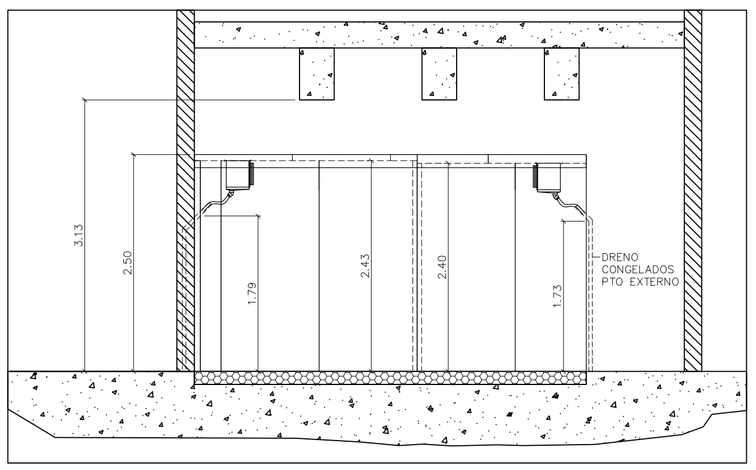

CORTE AA

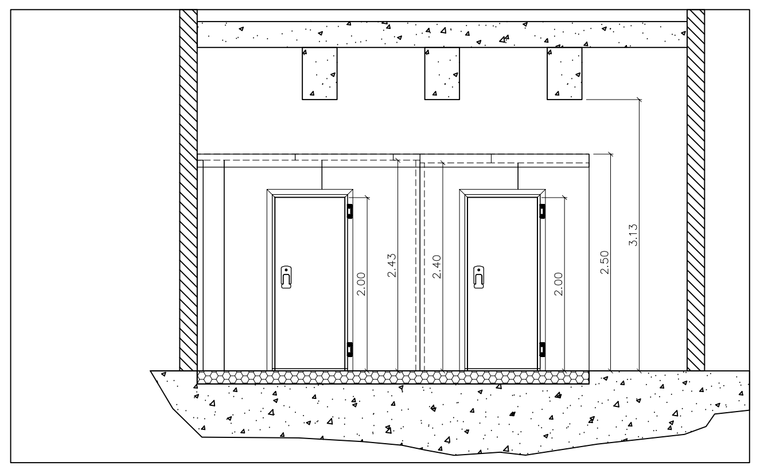

VISTA 2

APROVAÇÃO PARA PRODUÇÃO

DATA:	NOME RESPONSÁVEL:	ASSINATURA / CARIMBO:

DATA:	REVISÃO:	FOLHA:	ESCALA:	FORMATO:
10/12/2020	1	1	1:50	A1

COMPRADOR:
PADARIA FIORELLA-KLABIN - SR.MICHEL

ENDEREÇO / OBRA:
RUA ROUSSEAU, 34 - CEP: 04115-050 S.P.

TÍTULO
INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS

Fiorella PADARIA

HR Tedesco

www.hrtedesco.com.br
Rua Barra do Tibaji,934-Bom Retiro
CEP 01128-000 -SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3361-2111 / 3331-6738
WhatsApp (11) 99162-9474
